



#### 4. 추진계획

| 구분         | '22 |   | '23 |   |   |   | '24 |   |   |   | '25 |   |   |   | '26 |   | 비고 |
|------------|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|----|
|            | 3   | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 |    |
| 실시설계용역 준공  |     |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |
| 공사 착공 및 준공 |     |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |

#### 5. 추진실적

| 연도       | 추진내용  | 비고 |
|----------|---|----|
| '20.     | ○ 공모사업 선정(행정안전부)  |    |
| '21.     | ○ (일부 구간) 실시설계용역 준공   |    |
| '23.3    | ○ 사업대상지 확대(덕천시장 주변~덕천역 일원)<br>○ 추진계획 수립                           |    |
| '23.4    | ○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 구성   |    |
| '23.6    | ○ (확대 구간) 실시설계용역 시행(2023. 5. ~ 8.)<br>○ 공약사항 변경에 대한 공약자문단 자문의견 수렴 |    |
| '23.7    | ○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 개최<br>○ 부산시 설계자문 실시                          |    |
| '23.9~10 | ○ 관계기관 협의   |    |
| '23.12   | ○ 실시설계 용역 준공 및 공사 착공  |    |
| '24.6~8. | ○ 공사준공 및 교통안전 시설물 추가 설치   |    |

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

#### 7. 향후 추진계획

- 시설물 관리 철저 및 추가사업 발굴 등

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

| 설명회, 공청회 등                   | 만족도, 설문조사 | 위원회, 민간전문가 자문 등                | 언론·방송보도 | 기타 |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|----|
| '23.7.27/10.5<br>주민협의체<br>회의 |           | '23.8월 초<br>市 보행환경개선사업<br>설계자문 |         |    |


# 공사구간 위치도 및 사업 전·후 사진

○ 위치도



사업 전

사업 후

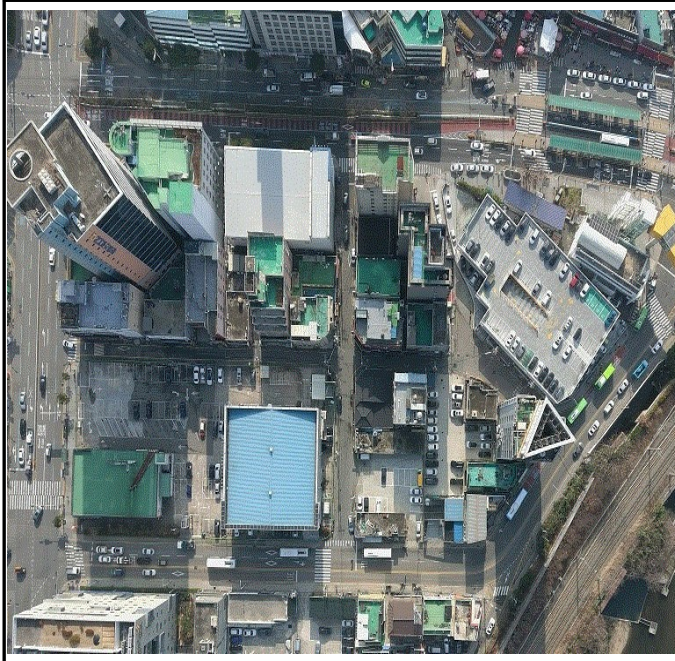




# 현장 사진




개선 전(좁은 보도폭, 노후 승강장)



개선 후(보도폭 확장 및 스마트승강장 설치)

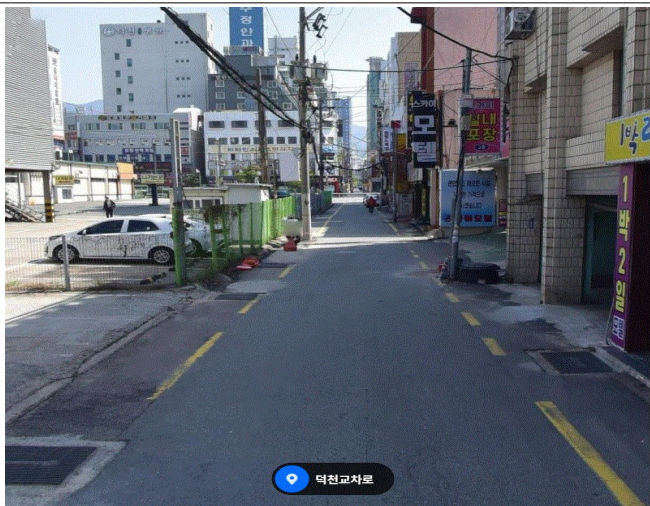

개선 전

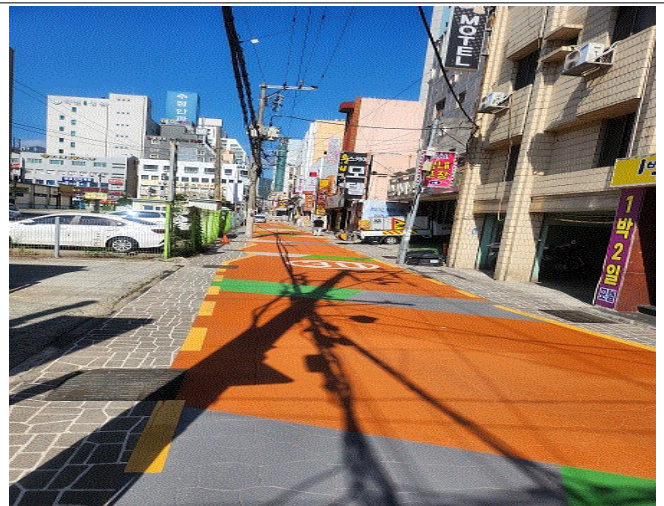

개선 후(패턴형 블록포장)



개선 전



개선 후(무단횡단방지 차선분리대 설치)
