

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'23				'24				'25				비고	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
본 공사 추진																		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'24	○공사추진[제방도로측 옹벽(1~3번) 가시설 및 복합말뚝 시공 중]	

6. 문제점 및 대책

○ 해당없음


위치도 및 현장사진(조감도)

- <중, 사업개요>**
- 위치 : 북구 광범대교 급곡과천교 교차지점
 - 사업규모
 - 도로건설 L=1.2km, B=4.5m(교량 L=278m)
 - 사업비 : 23,608백만원
(공사 21,583, 보상 -, 기타 2,046)
 - 사업기간 : 2021~2025

- <2023년 이전 투자>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=450m, B=4.5m
 - 사업비 : 10,717백만원
(공사 9,801, 보상 -, 기타 1,116)

- <2024년 투자구간>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=250m, B=4.5m
 - 사업비 : 3,000백만원
(공사 2,500, 보상 -, 기타 500)

- <2025년 투자구간>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=500m, B=4.5m, 교량2개소,
도로포장 A=9,500㎡
 - 사업비 : 9,892백만원
(공사 9,482, 보상 -, 기타 430)

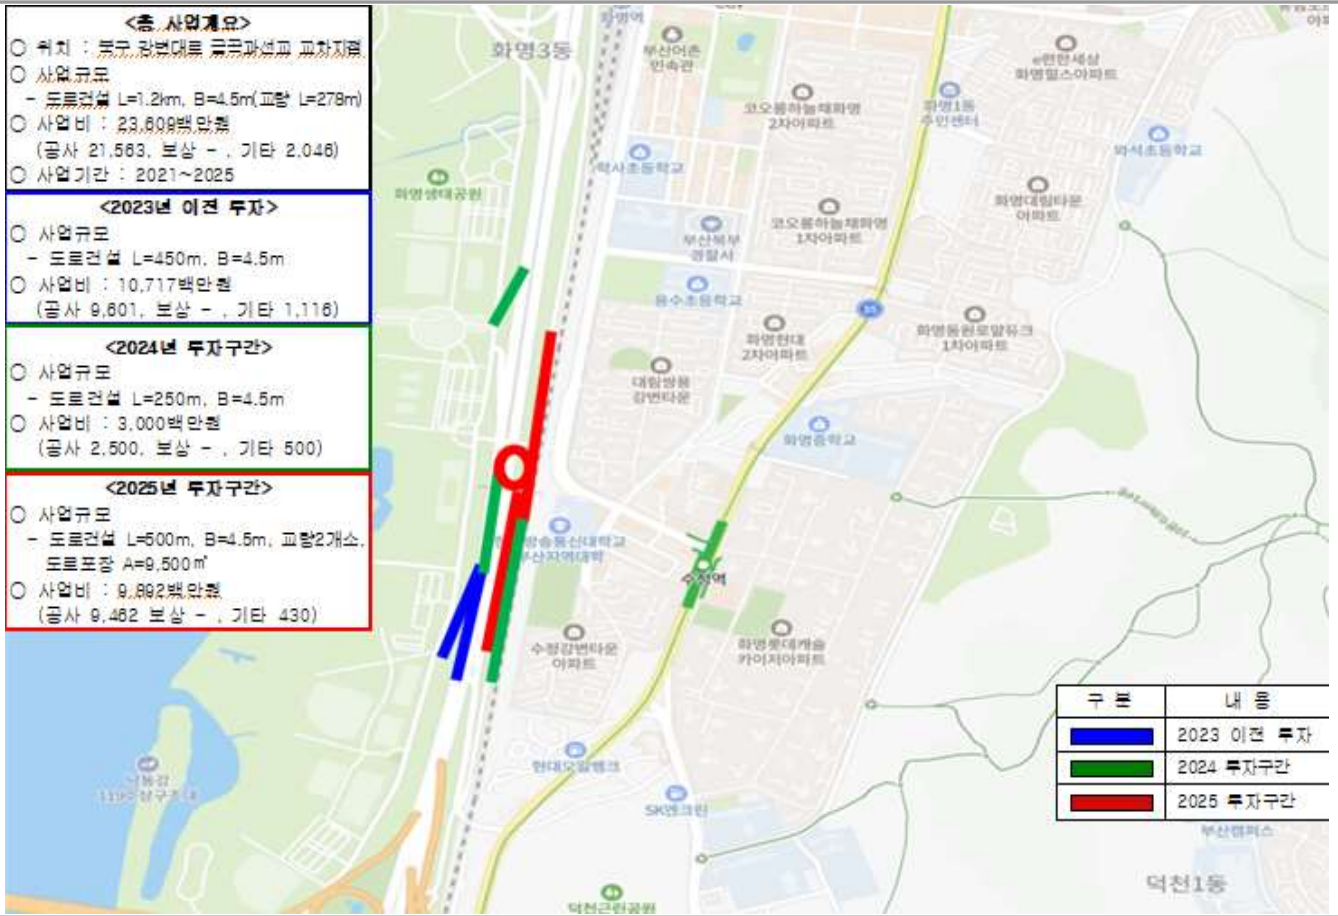

구분	내용
■	2023 이전 투자
■	2024 투자구간
■	2025 투자구간

