

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립			■														
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입				■	■	■	■										
설계 등 각종용역					■	■	■	■	■								
주차장 조성공사								■	■	■	■						

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 남산정공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	
'24.2분기	○ 백산공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 공사 발주	
'24.3분기	○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 건축물 해체 ○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 토목 구조물 설치	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획


- 2024. 4분기 : 남산정 공영주차장(10월 준공)/ 백산 공영주차장(11월 준공)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2024.1.12.(남산정공영) 2024.5.2.(백산공영)				

만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립


위 치 도

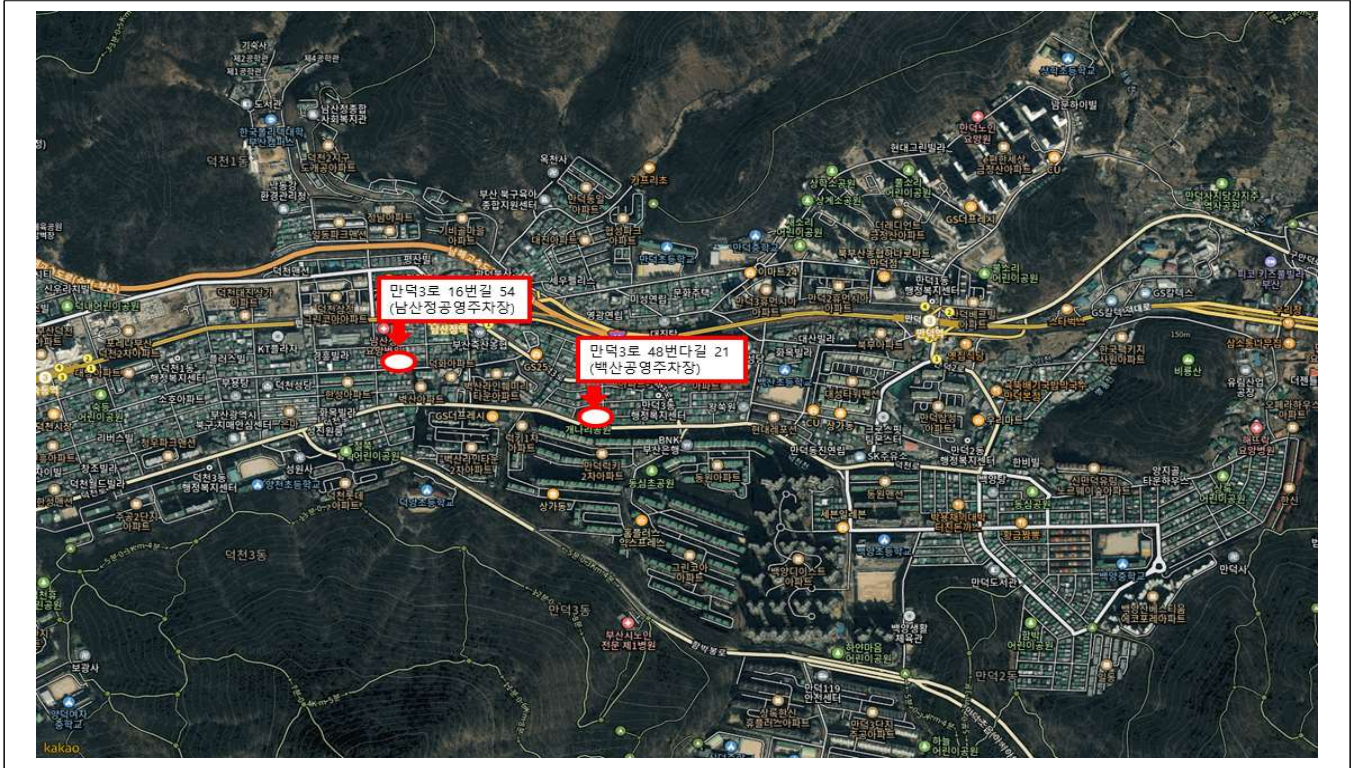

현장사진



남산정공영주차장



백산공영주차장
