

### 3-3

## 북부권역 미래교육센터 건립

주관 부서	교육지원과 교육지원팀	협조 부서		작성기준 2024.09.30.
	이정규(4165)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기내	계속	시교육청	부산시 교육청 시행	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2020년~2024년		17,856백만원	정상추진	85%

### 1. 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고, 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2020년 ~ 2024. 12. (※ 2024년 12월 개관 예정)
- 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)
- 사업규모 : 지상 5층, 연면적 7,225.45㎡ (본관+신관)
- 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 SW·AI 교육거점센터 건립

구분	주요기능	시설배치
1층	디지털 전환 체험공간	D라운지, 아카이브D, 아트스페이스, 뮤지엄D, 카페테리아, XR스테이션
2층	디지털 활용 교육공간	그라운드D, AIoT파크, SW코딩랩, AI스퀘어
3층	디지털 융복합 교육공간	데이터사이언스랩, 메타버스존, 로봇파크, 사무실
4층	디지털 콘텐츠 크리에이티브 공간	게임제작존, e스포츠파크, 뉴미디어스튜디오, AI크리에이티브존
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 대회의실, 다목적실(공연장)

- 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)
  - ▶ 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보내역				
	계	기투자	임기내				임기후	계	'22	'23	'24	'25	
			계	'22	'23	'24							'25
계	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		
기타 (시교육청)	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축 설계	■	■													
건축공사 착공			■												
설립 계획 변경			■	■	■										
전시·체험물 설계 및 제작·설치 입찰							■								
인테리어 공사 및 기자재 설치								■	■	■					
미래교육센터 개관														■	

※ 설립계획 변경 : (기존) '24년 9월 개관 ⇒ (변경) '24년 12월 개관


## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 9월	○ 북부권역 미래교육센터 설립 기본계획 수립	
'22. 7월	○ 건축설계 용역 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3~7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9~12월	○ 인테리어 설계 및 건축공사 준공	
'24. 5~6월	○ 전시·체험 콘텐츠 기본 및 실시설계	
'24. 7~11월	○ 인테리어 시공, 전시·체험물 설계 및 제작·설치	

## 6. 향후 추진계획

- 2024. 12월 : 시범 운영 및 개관

# 사업추진 관련 사진

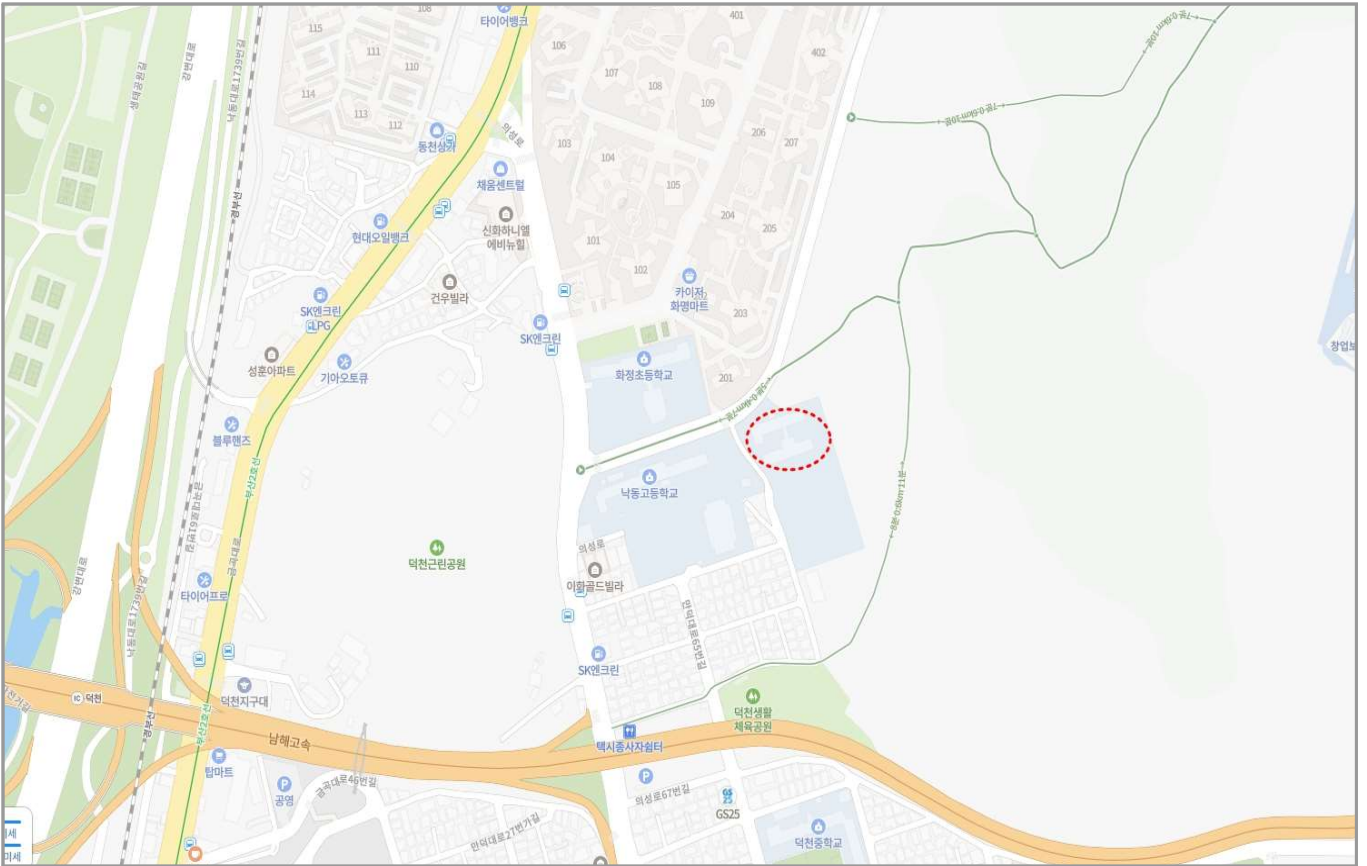

위 치 도



현 장 사 진
