

## 4-2

# 의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장

주관 부서	건설과 도시계획팀	협조 부서	부산광역시 공원정책과		작성기준 2024.12.31.
	정민규(☎4734)		김현영(051-888-3785)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
(임기 후)	(신규)	민간, 광역(시)	부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023. ~ 2028.		3,000백만원	미착수	0 %	

### 1. 정책목표

- 낙동고등학교 앞 교차로에서 남해고속도로 접속로 일원의 약 220m구간 1차선(B=3m) 추가 확폭 및 기반시설 정비하여 인근 구간 교통체증 해소

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업위치 : 부산광역시 북구 덕천동 444-15번지 일원
- 사업규모 : 도로 확폭(B=3m, L=220m, 1차선 추가) 및 기반시설 정비
- 사업내용 : 부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진 협의 및 사업비 확보
- 소요예산 : 3,000백만원(민간)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'23	'24	'25	'26
			계	'23	'24	'25	'26						
계	3,000	-	3,000	-	-	300	1,200	1,500	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 (민간)	3,000	-	3,000	-	-	300	1,200	1,500	-	-	-	-	-

#### 4. 추진계획

구분	'23	'24	'25				'26				'27				'28		비고
	1~4	1~4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'24.9.	○ 국가유산위원회(문화재 현상변경) 심의(조건부 가결)	

#### 6. 문제점 및 대책

- 덕천공원 민간공원 조성 사업은 문화재 현상변경 불허가(6차례)로 사업 추진 애로
  - ▷ 관련기관과 지속 협의 및 해결방안 모색, 2024년 하반기 재심의 완료
- 2024. 09. : 국가유산위원회(문화재 현상변경) 심의 조건부 가결
- 2024. 11. : 관련기관(부서) 의견협의



#### 7. 향후 추진계획

- 도시관리계획(덕천공원 조성계획) 결정(변경) 후, 덕천공원 민간공원 조성 사업 진행 절차에 맞춰 관련기관과 지속 협의 및 사업 추진


#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

# 사업추진 관련 사진 (위치도 및 현장사진)

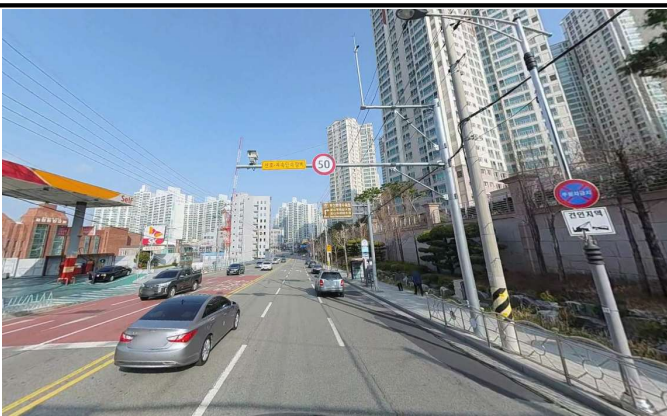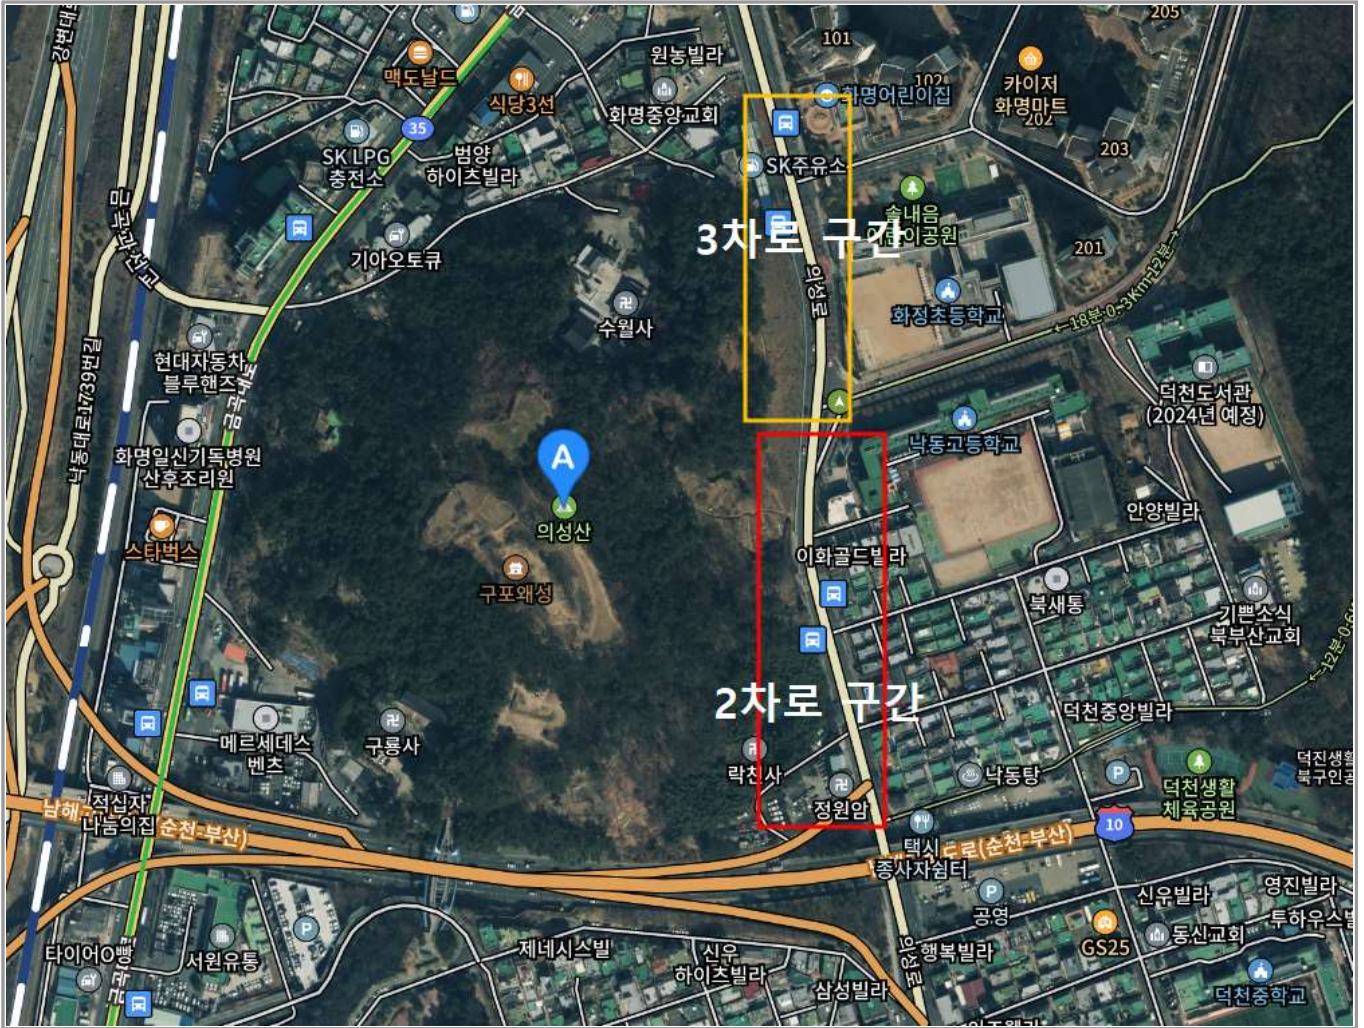

도로 사진(3차로 구간)

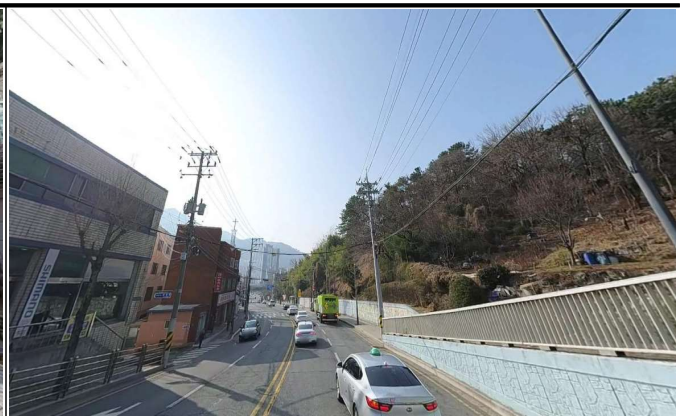

도로 사진(2차로 구간)
