

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 도시숲 4개소 조성	■	■															
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 도시숲 5개소 조성			■	■	■	■											
우리꽃길 차밭 조성 및 도시숲 3개소 조성							■	■	■	■							
우리꽃길 조성 및 도시숲 3개소 조성												■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료 - 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 5개소 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료 - 대천천 보행 산책로 정비사업 완료 - 긴미끄럼틀 썸지공원 리모델링사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 3개소 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 화명대로 가로화단 조성사업 완료 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 1차 완료 후 계속 - 와석공원 정비사업 추진중 	

6. 문제점 및 대책

- 와석공원 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2에 따른 BF예비인증 심의결과 후 실착공(11월예정) 가능
 - ⇒ 와석공원 정비사업비(특별교부세) 사고이월 요청
 - ⇒ BF인증 심사심의 보완사항 능동적 대처를 위한 관계기관 및 시공사 수시 협의


7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none"> · 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2024.2.7. 주민설명회개최 (와석공원 정비사업) 		<ul style="list-style-type: none"> · 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업) · 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업) · 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업) 	-	-

화명대로 가로화단 조성사업

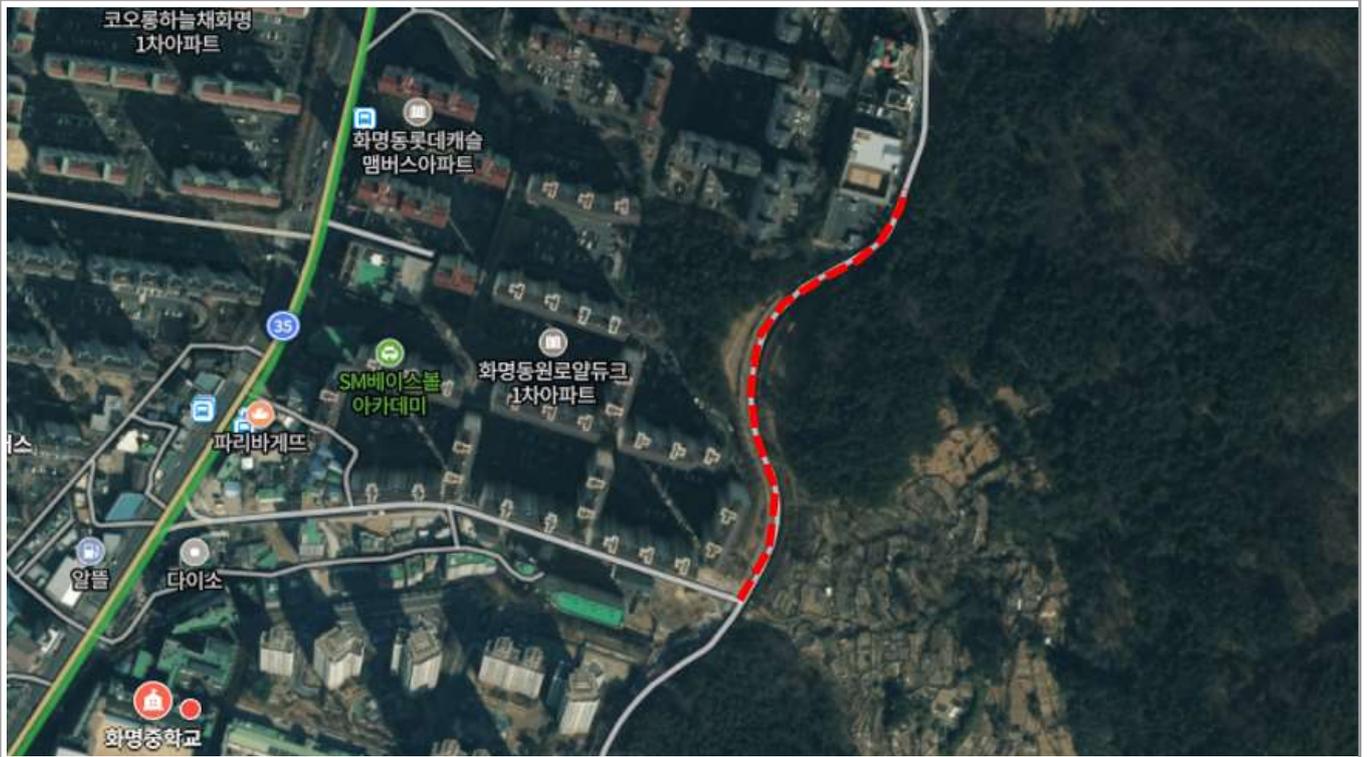


위 치 도



완료사진

만덕고갯길 도시숲(테마정원) 조성사업

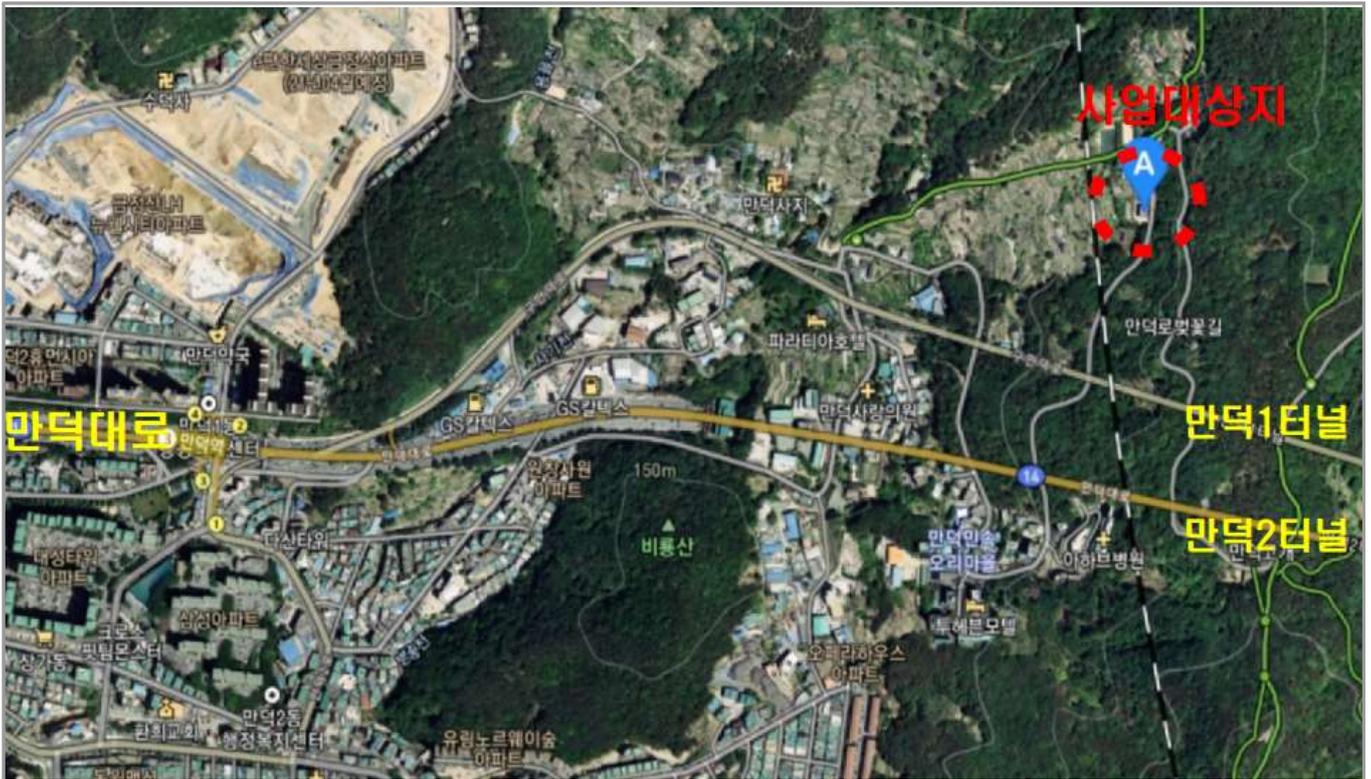

위 치 도



현장사진(전망휴게공간 설치 및 수목식재)

만덕고갯길 도시숲(테마정원) 조성사업



종합계획도(안)



△ 신비의 숲(배배영감 스토리)



△ 금정산 숲정원



△ 스토리월가든(야간, 미디어아트)



△ 스토리월가든(야간, 미디어아트)

상세이미지

